









Travaux 2017

Travaux lignes aériennes :

- Poursuite des travaux engagés
 - · Réalisation de l'ensemble des fondations
 - · Levage de la quasi-totalité des pylônes
- Début des travaux de la ligne Argentière-Briançon 1
- Suppression de la ligne Aérienne 63 kV Argentière-Montdauphin (15 km)

- <u>Travaux Lignes souterraines :</u>
 Mise en service de la ligne Argentière Mont-Dauphin
 - Réalisation de 50 % du Génie Civil de la ligne Argentière Briançon 2
 - Démarrage des travaux de la liaison Mont-Dauphin Pralong

- Travaux Postes :

 Poursuite des travaux engagés
 - Serre-Barbin, Briançon, Montdauphin
 - Montage du transformateur 225/63 kV à L'Argentière
 - Raccordement et mise en service du poste des Sagnes (client EDSB)







Suivi environnemental des travaux (1/3)

Rappel sur l'objectif: éviter et réduire les impacts en phase travaux


- des réunions de sensibilisation avant travaux sur les engagements pris par RTE, leur modalités de mise en œuvre et les sanctions encourues en cas de non respect.
- · des audits préalables : repérage sur le terrain des enjeux avec le chef de chantier, marquage/mise en défens des zones à préserver, rappel des prescriptions, analyse de propositions d'adaptation ponctuelles du projet ...
- · des audits de contrôle et d'évaluation des mesures.


✓ Procédure de compte-rendu

Envoi des comptes-rendus mensuellement à la DREAL

✓ 2 comités de suivi environnemental



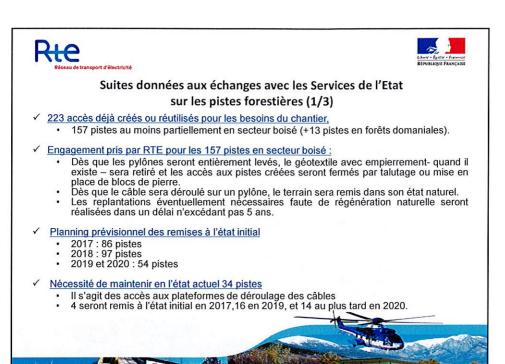

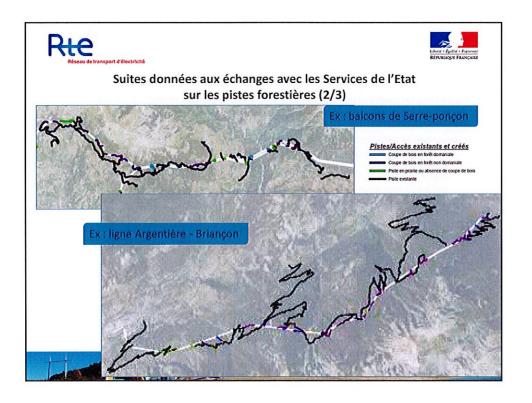





Suites données aux échanges avec les Services de l'Etat sur les pistes forestières (3/3)

- 125 accès restant à réaliser
 47 pistes au moins partiellement en secteur boisé (hors pistes en forêts domaniales).
- Engagement pris par RTE pour ces 47 pistes à créer en secteur boisé :
 - La pose de géotextile avec empierrement sera strictement réservée aux 8 pistes d'accès aux plateformes de déroulage et aux 12 pistes d'accès aux plateformes des pylônes levés à la grue (sauf nécessité majeure liée à la sécurité du chantier qui ferait l'objet d'une demande spécifique auprès des services de l'Etat).
- Si certains accès doivent évoluer par rapport à leur emplacement prévu initialement
 - Renforcement de la formalisation afin de garantir une meilleure traçabilité des décisions détaillant le processus d'évaluation ayant conduit ECO-MED à émettre un avis favorable ou défavorable sur le tracé proposé : rappel des impacts du tracé initial et mise en perspective avec ceux pressentis ou identifiés lors de la visite de terrain, démarche d'évitement et de réduction des impacts, cartographie précise.
 - conclusion claire validant le tracé dans le cas où les impacts sont équivalents voire réduits ou donnant un avis défavorable.









Mesures de compensation


- Restauration et gestion d'une parcelle agricole pour la gagée des champs : En attente
- Restauration de la fonctionnalité de l'ile forestière de l'Estang : Sollicitation de l'ARS pour hydrogéologue agréé.
- Restauration de pelouses sèches à Mésophiles
 - Convention signée avec la Chambre d'agriculture
 - Définition, en fonction des espèces ciblées, de l'enveloppe spatiale au sein de laquelle les parcelles compensatoires seront recherchées
 - · Identification de secteurs favorables à la réouverture de milieux et au pâturage
 - → Analyse de terrain au printemps
- ✓ Restauration expérimentale de zones ouvertes remaniée :
 - · Convention signée avec ISTEA, UAPV et ECOMED
 - → Études préalables en cours
- ✓ Mise en place de cultures faunistiques
 - Convention signée avec la Chambre d'agriculture
 - Identification en cours par la Chambre d'agriculture et les associations de chasse
- ✓ Expertise des ouvrages d'art existants : à lancer
- Restauration écologique d'un bas marais alcalin : En cours de conventionnement avec le propriétaire
- Identification des points de conflit entre le réseau électrique et les rapaces :
 - Groupe de travail : CEFE, DREAL, PN Ecrins, PNR Queyras, CSFS, envergures alpines, LPO
 - 1ère réunion le 23 mars 2017.



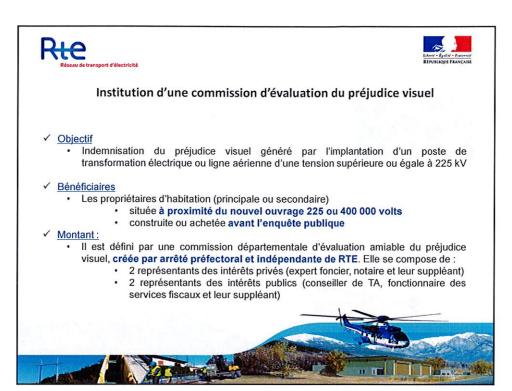



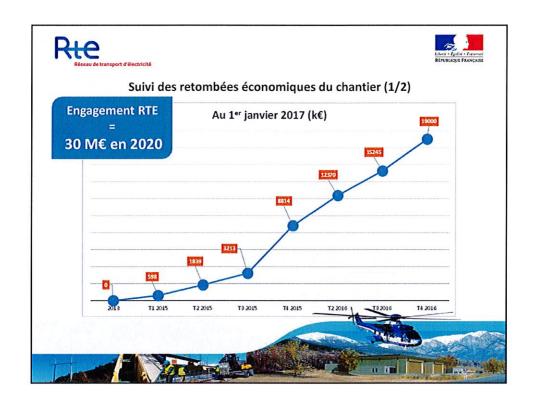

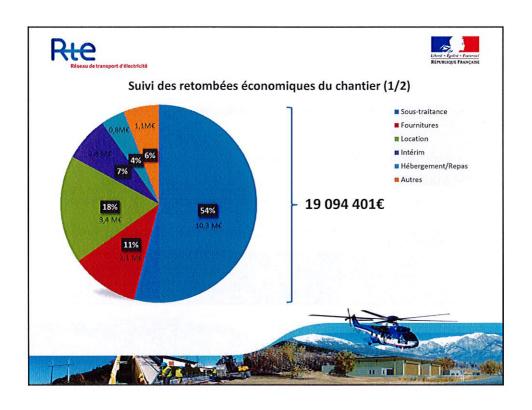

Plan d'accompagner Projets Montar	nt de l'opération (€)	Montant du PAP (€)
St martin de Queyrières Patrimoine		227 945
t martin de Queyrières bâtiments publics		49 642
avines aménagement autour du XX eme		256 000
'argentière rue des écoles	263 000	87 185
'argentière RN 94	475 497	148 640
hampcella salle multi-activités école	311 362	140 471
Chorges	580 245	
Total		
Rappels des projets validés 2	924 679 €	1 103 791 €

